Bjørka brl - fremdriftsplan
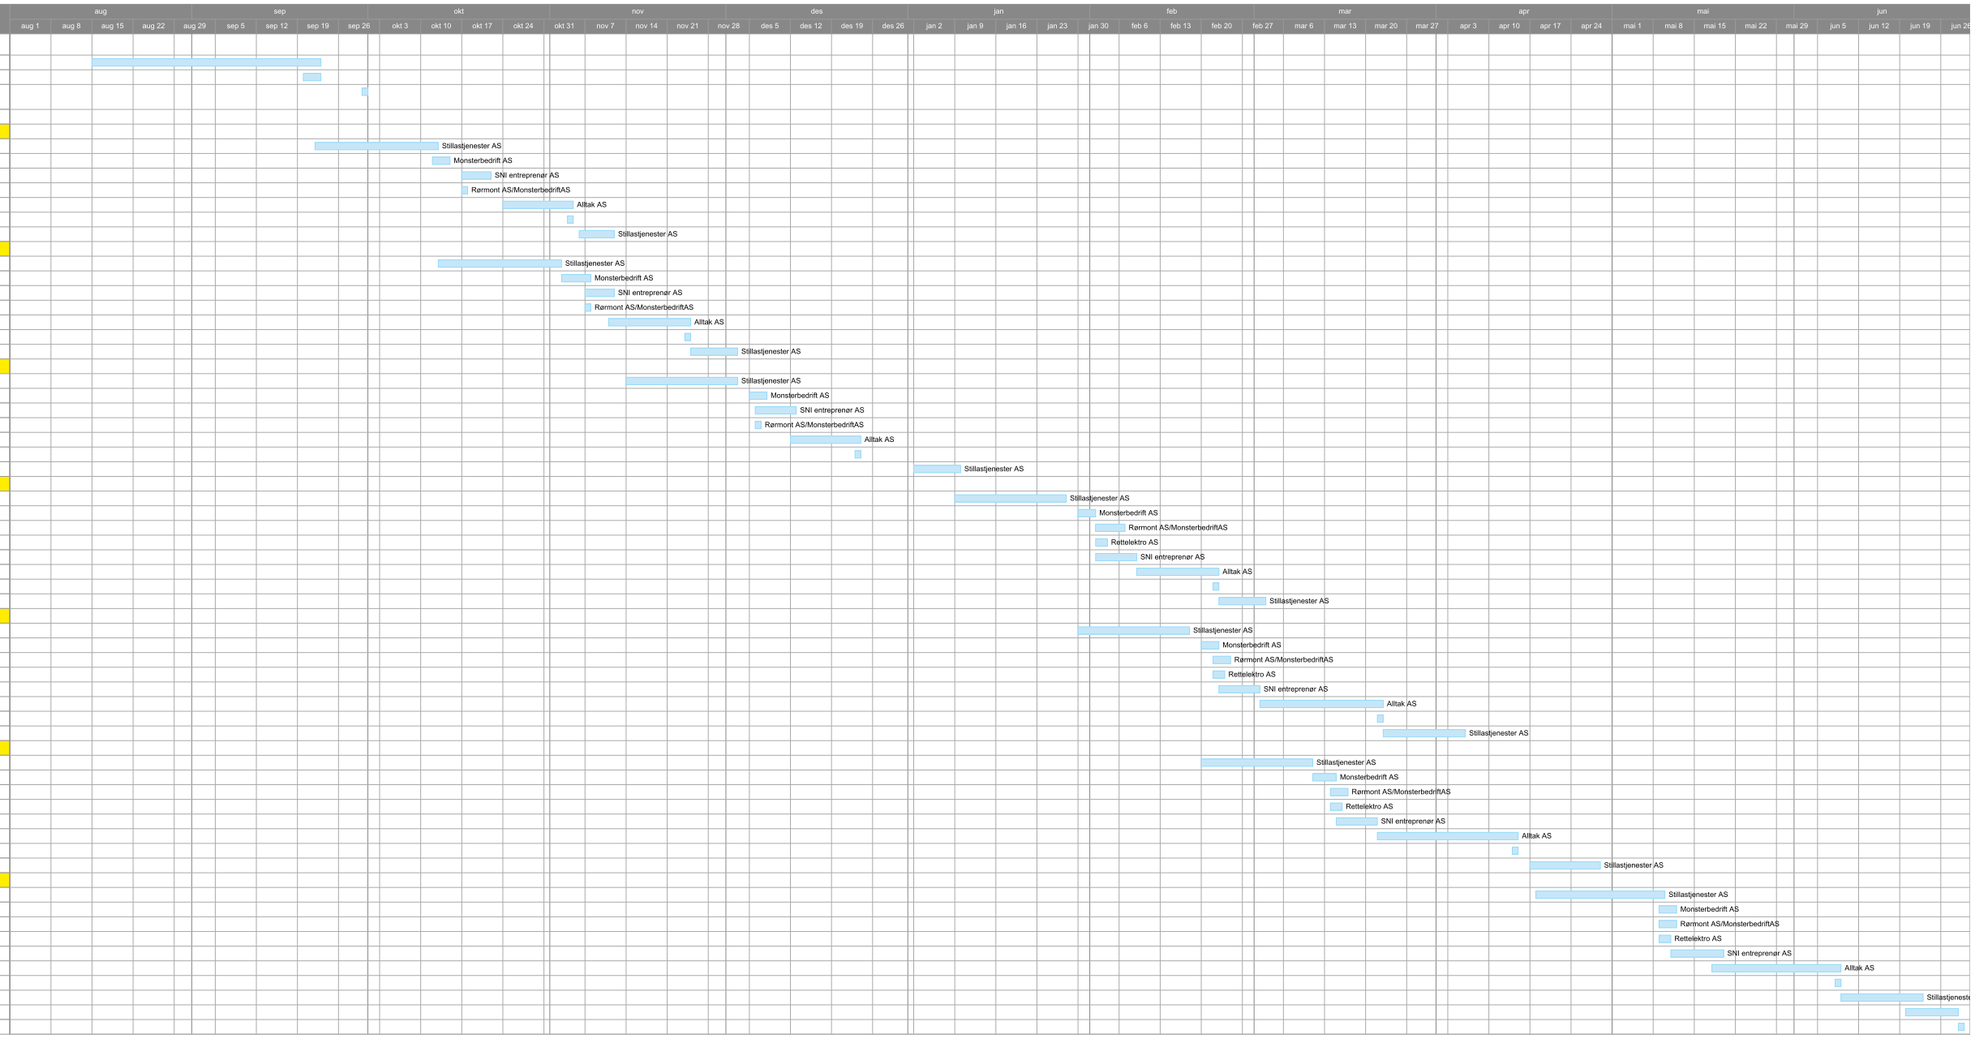
	Task Name	Duration	Start	Finish
1	**Bjørka brl - takrehabilitering**			
2	Mobilisering, planlegging, prosjektering	29d	15.08.22	22.09.22
3	Rigging, etablering av brakerigg, prosjektering	3d	20.09.22	22.09.22
4	Utsending av ettrinns søknad ved mulig brudd på brannskille - kjerneborring av betongdekke vedr etablering av flere taksluk	1d	30.09.22	30.09.22
5	Vernerunder hver annen uke (f.o.m fysisk oppstart på byggeplass)			
6	**Prøveblokk Lindebergåsen 34**			
7	Montering av stillas med tak-over-tak	15d	22.09.22	12.10.22
8	Riving av eksisterende isolasjon, taktekking, beslag	3d	12.10.22	14.10.22
9	Heving av parapet	5d	17.10.22	21.10.22
10	utskifting av taksluk (evt kjerneborring for større taksluk)	1d	17.10.22	17.10.22
11	Isolering med PIR isolasjon, 2 lags tekking, blikkenslagerarbeid	10d	24.10.22	04.11.22
12	Befaring med BH før oppstart demontering av stillas	1d	04.11.22	04.11.22
13	demontering av stillas	6d	06.11.22	11.11.22
14	**Lindebergåsen 28**			
15	Montering av stillas med tak-over-tak	15d	13.10.22	02.11.22
16	Riving av eksisterende isolasjon, taktekking, beslag	3d	03.11.22	07.11.22
17	Heving av parapet	5d	07.11.22	11.11.22
18	utskifting av taksluk (evt kjerneborring for større taksluk)	1d	07.11.22	07.11.22
19	Isolering med PIR isolasjon, 2 lags tekking, blikkenslagerarbeid	10d	11.11.22	24.11.22
20	Befaring med BH før oppstart demontering av stillas	1d	24.11.22	24.11.22
21	demontering av stillas	6d	25.11.22	02.12.22
22	**Lindebergåsen 24**			
23	Montering av stillas med tak-over-tak	15d	14.11.22	02.12.22
24	Riving av eksisterende isolasjon, taktekking, beslag	3d	05.12.22	07.12.22
25	Heving av parapet	5d	06.12.22	12.12.22
26	utskifting av taksluk (evt kjerneborring for større taksluk)	1d	06.12.22	06.12.22
27	Isolering med PIR isolasjon, 2 lags tekking, blikkenslagerarbeid	10d	12.12.22	23.12.22
28	Befaring med BH før oppstart demontering av stillas	1d	23.12.22	23.12.22
29	demontering av stillas	6d	02.01.23	09.01.23
30	**Lindebergåsen 30**			
31	Montering av stillas med tak-over-tak	15d	09.01.23	27.01.23
32	Riving av eksisterende isolasjon, taktekking, beslag	3d	30.01.23	01.02.23
33	kjærneboring og etablering av nye taksluk	3d	02.02.23	06.02.23
34	riving av eksisterende og montering av nye røykluker	2d	02.02.23	03.02.23
35	Heving av parapet	5d	02.02.23	08.02.23
36	Isolering med PIR isolasjon, 2 lags tekking, blikkenslagerarbeid	10d	09.02.23	22.02.23
37	Befaring med BH før oppstart demontering av stillas	1d	22.02.23	22.02.23
38	demontering av stillas	6d	23.02.23	02.03.23
39	**Lindebergåsen 26**			
40	Montering av stillas med tak-over-tak	15d	30.01.23	17.02.23
41	Riving av eksisterende isolasjon, taktekking, beslag	3d	20.02.23	22.02.23
42	kjærneboring og etablering av nye taksluk	3d	22.02.23	24.02.23
43	riving av eksisterende og montering av nye røykluker	2d	22.02.23	23.02.23
44	Heving av parapet	5d	23.02.23	01.03.23
45	Isolering med PIR isolasjon, 2 lags tekking, blikkenslagerarbeid	15d	02.03.23	22.03.23
46	Befaring med BH før oppstart demontering av stillas	1d	22.03.23	22.03.23
47	demontering av stillas	10d	23.03.23	05.04.23
48	**Lindebergåsen 32**			
49	Montering av stillas med tak-over-tak	15d	20.02.23	10.03.23
50	Riving av eksisterende isolasjon, taktekking, beslag	3d	11.03.23	14.03.23
51	kjærneboring og etablering av nye taksluk	3d	14.03.23	16.03.23
52	riving av eksisterende og montering av nye røykluker	2d	14.03.23	15.03.23
53	Heving av parapet	5d	15.03.23	21.03.23
54	Isolering med PIR isolasjon, 2 lags tekking, blikkenslagerarbeid	15d	22.03.23	14.04.23
55	Befaring med BH før oppstart demontering av stillas	1d	14.04.23	14.04.23
56	demontering av stillas	10d	17.04.23	28.04.23
57	**Lindebergåsen 36**			
58	Montering av stillas med tak-over-tak	15d	18.04.23	09.05.23
59	Riving av eksisterende isolasjon, taktekking, beslag	3d	09.05.23	11.05.23
60	kjærneboring og etablering av nye taksluk	3d	09.05.23	11.05.23
61	riving av eksisterende og montering av nye røykluker	2d	09.05.23	10.05.23
62	Heving av parapet	5d	11.05.23	19.05.23
63	Isolering med PIR isolasjon, 2 lags tekking, blikkenslagerarbeid	15d	18.05.23	08.06.23
64	Befaring med BH før oppstart demontering av stillas	1d	08.06.23	08.06.23
65	demontering av stillas	10d	09.06.23	22.06.23
66	**nedrigging**	7d	20.06.23	28.06.23
67	**overtagelse prosjektet**	1d	29.06.23	29.06.23
